



CERTIFICADO DE QUALIDADE															FQ 132
ENSAIOS QUÍMICOS E FÍSICOS DO CIMENTO CP III 40 RS															
UNIDADE: MOGI DAS CRUZES															mar/25
Dia	Composição Química				Resistência a Compressão			Finura				Expansibilidade	Pega		Consistencia
	P. Fogo ≤ 6,5	RI ≤ 5,0	SO ₃ ≤ 4,5	CaO Livre	03 Dias ≥ 12,0	07 Dias ≥ 23,0	28 Dias ≥ 40,0	Massa Específica	Blaine	# 325	# 200 ≤ 8,0	Quente	Início ≥ 60	Fim ≤ 720	Normal
	%	%	%	%	MPa	MPa	MPa	g/cm³	cm²/g	%	%	mm	min	min	%
01/03/25	3,93	1,50	1,58	0,55	24,2	34,8	49,3	3,00	4317	1,3	0,2	0,0	180	220	30,8
02/03/25															
03/03/25	3,88	1,50	1,54	0,59	24,2	34,8	49,3	3,00	4229	0,9	0,2	0,0	200	240	31,2
04/03/25	3,30	1,50	1,47	0,57	23,8	33,5	49,8	3,00	4227	1,2	0,2	0,0	200	240	30,8
05/03/25	2,97	1,30	1,51	0,60	23,2	33,5	50,3	3,00	4143	1,3	0,3	0,0	200	245	30,6
06/03/25	4,00	1,50	1,65	0,61	23,2	33,5	50,3	3,00	4219	1,2	0,2	0,0	190	240	31,0
07/03/25	3,98	1,50	1,57	0,60	23,9	33,0	50,1	3,00	4420	0,5	0,2	0,0	210	250	30,6
08/03/25	4,37	1,50	1,68	0,58	24,5	35,0	50,3	3,00	4456	0,8	0,2	0,0	190	230	31,0
09/03/25															
10/03/25	4,25	1,60	1,65	0,44	23,4	34,8	49,0	3,00	4145	1,3	0,2	0,0	210	250	30,4
11/03/25	4,47	2,00	1,55	0,53	22,8	33,6	49,1	3,00	4140	1,5	0,3	0,0	210	255	29,0
12/03/25	4,10	1,90	1,54	0,55	22,9	33,6	48,6	3,00	4180	1,5	0,3	0,0	210	250	31,2
13/03/25	3,94	1,90	1,34	0,60	22,9	33,2	48,6	3,00	4107	1,2	0,2	0,0	210	240	31,0
14/03/25	4,58	1,90	1,65	0,62	23,2	36,0	48,7	3,00	4331	1,1	0,2	0,0	210	250	30,0
15/03/25	4,96	2,00	1,58	0,67	23,1	36,2	48,4	3,00	4281	1,5	0,2	0,0	210	250	30,2
16/03/25															
17/03/25	4,75	1,70	1,51	0,70	23,0	33,0	48,8	3,00	4382	1,4	0,2	0,0	180	230	30,2
18/03/25	5,54	1,80	1,68	0,74	24,4	35,0	49,1	3,00	4454	1,1	0,2	0,0	170	240	30,0
19/03/25	4,92	1,70	1,61	0,67	23,1	33,3	49,3	3,00	4321	1,5	0,2	0,0	190	220	29,4
20/03/25	5,25	1,80	1,65	0,74	23,1	33,3	49,3	3,00	4178	1,3	0,2	0,0	210	260	30,0
21/03/25	4,41	1,90	1,30	0,75	23,1	33,1	49,5	3,00	4326	0,9	0,2	0,0	200	240	30,0
22/03/25	4,53	1,60	1,58	0,73	23,1	34,0	49,0	3,00	4185	1,5	0,2	0,0	180	230	30,0
23/03/25															
24/03/25	4,25	1,60	1,51	0,77	23,1	34,9	49,0	3,00	4161	1,5	0,3	0,0	210	250	30,2
25/03/25	4,52	2,10	1,61	0,57	23,3	35,0	51,8	3,00	4107	1,0	0,2	0,0	200	240	30,2
26/03/25	4,91	1,80	1,54	0,64	23,5	33,8	51,3	3,00	4310	1,1	0,2	0,0	200	240	30,2
27/03/25	4,46	1,80	1,47	0,66	23,5	33,8	51,3	3,00	4153	2,1	0,3	0,0	200	235	30,2
28/03/25	4,72	1,70	1,72	0,64	23,8	34,4	49,5	3,00	4213	1,5	0,3	0,0	200	245	30,2
29/03/25	4,39	2,00	1,58	0,63	23,9	33,9	48,8	3,00	4113	1,2	0,1	0,0	200	240	30,2
30/03/25															
31/03/25	4,71	1,80	1,54	0,61	24,8	34,8	48,4	3,00	4239	0,7	0,2	0,0	190	220	30,0

					R3	R7	R28								
MÉDIA	4,39	1,73	1,56	0,63	23,5	34,1	49,5	3,0	4.244	1,2	0,2	0,0	198	240	30,3
DESVIO	0,55	0,21	0,10	0,08	0,6	0,9	0,9	0,0	107	0,3	0,0	0,0	12	11	0,5
NBR 16697:2017	≤6,5	≤5,0	≤4,5		≥ 12,0	≥ 23,0	≥ 40,0				≤ 8,0	≤ 5,0	≥ 60	≤ 720	

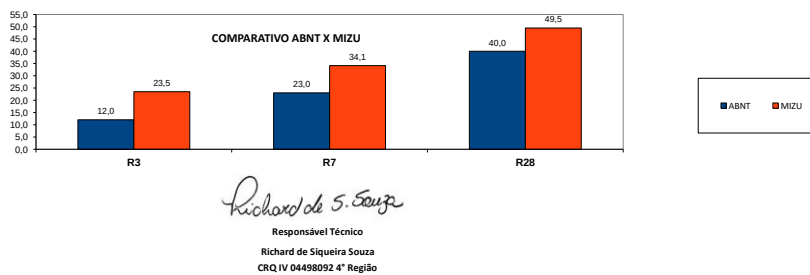

FQ 132															
CERTIFICADO DE QUALIDADE															
ENSAIOS QUÍMICOS E FÍSICOS DO CIMENTO CP III 40 RS															
UNIDADE: MOGI DAS CRUZES															
abr/25															
Dia	Composição Química				Resistência a Compressão			Finura				Expansibilidade	Pega		Consistência
	P. Fogo ≤ 6,5	RI ≤ 5,0	SO ₃ ≤ 4,5	CaO Livre	03 Dias ≥ 12,0	07 Dias ≥ 23,0	28 Dias ≥ 40,0	Massa Específica	Blaine	# 325	# 200 ≤ 8,0	Quente	Início ≥ 60	Fim ≤ 720	Normal
	%	%	%	%	MPa	MPa	MPa	g/cm ³	cm ² /g	%	%	mm	min	min	%
01/04/25	4,54	2,00	1,51	0,63	23,8	33,1	49,8	3,00	4451	0,8	0,2	0,0	190	235	30,2
02/04/25	4,02	2,20	1,61	0,65	23,4	34,8	48,9	3,00	4292	1,5	0,2	0,0	180	225	30,2
03/04/25	3,83	1,60	1,44	0,61	23,4	34,8	48,9	3,00	4503	1,0	0,2	0,0	190	240	30,2
04/04/25	3,52	1,60	1,61	0,64	23,0	34,1	49,8	3,00	4456	1,0	0,2	0,0	180	230	30,2
05/04/25	4,14	2,00	1,61	0,62	23,2	34,5	50,6	3,00	4274	1,3	0,2	0,0	190	235	30,2
06/04/25															
07/04/25	4,07	1,90	1,58	0,60	23,1	34,8	50,8	3,00	4297	1,5	0,2	0,0	200	240	29,6
08/04/25	4,09	2,00	1,58	0,63	23,0	35,0	51,9	3,00	4371	1,5	0,2	0,0	200	250	29,6
09/04/25	4,03	2,00	1,61	0,61	23,5	34,5	51,8	3,00	4404	1,3	0,2	0,0	190	230	30,0
10/04/25	4,36	1,90	1,44	0,60	23,5	34,5	51,8	3,00	4214	1,4	0,2	0,0	190	240	30,2
11/04/25	4,03	1,50	1,58	0,64	23,3	34,9	49,4	3,00	4130	1,1	0,2	0,0	195	240	30,2
12/04/25	4,11	1,80	1,58	0,63	23,1	33,9	50,4	3,00	4172	1,0	0,2	0,0	200	240	30,2
13/04/25															
14/04/25	3,97	2,00	1,68	0,60	23,4	34,7	50,3	3,00	4329	1,1	0,2	0,0	180	225	29,6
15/04/25	4,08	1,80	1,54	0,62	23,2	35,0	49,8	3,00	4411	1,0	0,2	0,0	200	250	30,0
16/04/25	4,14	1,90	1,54	0,68	23,1	34,8	51,3	3,00	4274	1,5	0,2	0,0	200	245	30,8
17/04/25	4,10	2,10	1,54	0,63	23,1	34,8	51,3	3,00	4459	1,1	0,2	0,0	190	235	30,2
18/04/25															
19/04/25	4,02	1,90	1,44	0,61	24,1	34,9	51,9	3,00	4297	1,2	0,1	0,0	200	245	30,2
20/04/25															
21/04/25															
22/04/25	4,05	1,80	1,40	0,67	23,8	33,8	51,7	3,00	4375	1,3	0,2	0,0	190	240	30,0
23/04/25	4,40	1,80	1,41	0,68	23,1	34,6	51,9	3,00	4207	1,1	0,2	0,0	200	255	30,2
24/04/25	4,20	1,60	1,40	0,62	23,1	34,6	51,9	3,00	4205	1,2	0,2	0,0	200	240	30,0
25/04/25	4,25	1,40	1,51	0,65	23,5	35,0	51,4	3,00	4244	1,3	0,2	0,0	210	250	30,2
26/04/25															
27/04/25															
28/04/25	4,50	1,90	1,44	0,63	24,5	35,1	52,0	3,00	4405	1,0	0,2	0,0	180	220	29,8
29/04/25	4,08	1,80	1,47	0,67	24,9	34,7	51,7	3,00	4276	1,3	0,2	0,0	200	230	29,8
30/04/25	4,74	1,70	1,47	0,65	24,9	34,7	50,7	3,00	4281	1,3	0,2	0,0	200	250	30,2

					R3	R7	R28								
MÉDIA	4,14	1,83	1,52	0,63	23,5	34,6	50,9	3,0	4.319	1,2	0,2	0,0	194	239	30,1
DESVIO	0,25	0,20	0,08	0,02	0,6	0,5	1,0	0,0	102	0,2	0,0	0,0	8	9	0,3
NBR 16697:2017	≤6,5	≤5,0	≤4,5		≥ 12,0	≥ 23,0	≥ 40,0				≤ 8,0	≤ 5,0	≥ 60	≤ 720	

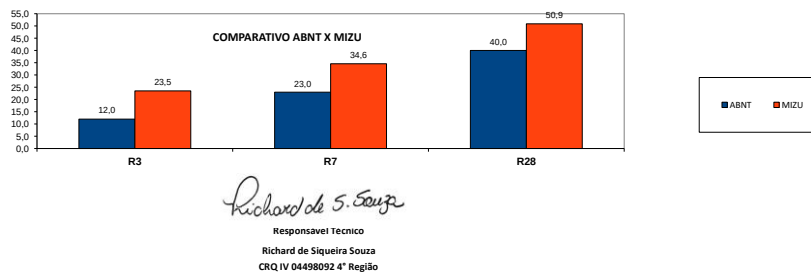

CERTIFICADO DE QUALIDADE															FQ.132
ENSAIOS QUÍMICOS E FÍSICOS DO CIMENTO CP III 40 RS															
UNIDADE: MOGI DAS CRUZES															mai/25
Dia	Composição Química				Resistência a Compressão			Finura				Expansibilidade	Pega		Consistencia
	P. Fogo ≤ 6,5	RI ≤ 5,0	SO ₃ ≤ 4,5	CaO Livre	03 Dias ≥ 12,0	07 Dias ≥ 23,0	28 Dias ≥ 40,0	Massa Específica	Blaine	# 325	# 200 ≤ 8,0	Quente	Início ≥ 60	Fim ≤ 720	Normal
	%	%	%	%	MPa	MPa	MPa	g/cm ³	cm ² /g	%	%	mm	min	min	%
01/05/25															
02/05/25	4,36	1,80	1,54	0,69	23,7	35,1	49,5	3,00	4250	1,1	0,2	0,0	200	245	30,2
03/05/25	4,34	1,80	1,41	0,67	23,9	34,3	49,7	3,00	4158	1,5	0,3	0,0	200	240	30,0
04/05/25															
05/05/25	4,92	1,60	1,40	0,65	25,0	35,0	50,2	3,00	4211	1,3	0,2	0,0	210	250	30,4
06/05/25	4,58	1,80	1,41	0,66	23,2	33,4		3,00	4152	1,4	0,2	0,0	210	250	30,0
07/05/25	4,40	1,90	1,68	0,62	24,6	33,4		3,00	4226	1,3	0,2	0,0	210	240	30,0
08/05/25	4,76	2,00	1,68	0,64	24,6	33,4		3,00	4397	1,1	0,2	0,0	210	255	30,0
09/05/25	4,12	2,00	1,61	0,66	23,2	34,8		3,00	4237	1,3	0,2	0,0	210	245	30,0
10/05/25	4,52	1,60	1,51	0,69	23,5	34,9		3,00	4344	1,1	0,3	0,0	200	250	30,4
11/05/25															
12/05/25	4,16	1,60	1,54	0,67	23,5	35,1		3,00	4423	1,3	0,2	0,0	190	250	30,2
13/05/25	4,16	2,00	1,47	0,65	24,2	35,0		3,00	4352	1,3	0,2	0,0	195	250	30,2
14/05/25	4,18	1,90	1,54	0,61	24,4	34,9		3,00	4121	1,0	0,2	0,0	210	260	30,2
15/05/25	4,50	2,00	1,58	0,63	24,4	34,9		3,00	4299	0,8	0,2	0,0	205	250	30,2
16/05/25	4,30	1,90	1,47	0,62	24,1	34,8		3,00	4211	0,9	0,2	0,0	190	240	30,0
17/05/25	3,76	1,90	1,40	0,60	23,2	34,5		3,00	4203	0,8	0,2	0,0	210	250	30,2
18/05/25															
19/05/25	4,11	1,90	1,51	0,65	24,5	35,1		3,00	4241	1,4	0,2	0,0	190	240	30,2
20/05/25	4,04	2,00	1,54	0,69	24,5	35,1		3,00	4286	1,5	0,2	0,0	190	240	29,6
21/05/25	3,93	2,10	1,51	0,68	23,0	35,0		3,00	4250	1,5	0,2	0,0	205	260	29,8
22/05/25	4,57	2,10	1,40	0,65	23,0	35,0		3,00	4253	1,3	0,2	0,0	210	250	30,2
23/05/25	4,90	1,90	1,41	0,64	23,2	35,2		3,00	4229	1,5	0,2	0,0	210	250	29,8
24/05/25	4,12	2,20	1,41	0,62	23,2	34,3		3,00	4112	1,4	0,2	0,0	210	260	30,2
25/05/25															
26/05/25	3,87	2,00	1,41	0,67	23,1	35,1		3,00	4161	1,1	0,2	0,0	210	250	30,0
27/05/25	4,35	1,90	1,46	0,69	23,2			3,00	4283	1,2	0,2	0,0	210	255	30,2
28/05/25	4,24	1,90	1,43	0,70	23,6			3,00	4344	1,2	0,2	0,0	210	250	30,0
29/05/25	4,27	1,90	1,41	0,68				3,00	4200	0,9	0,2	0,0	210	250	30,0
30/05/25	4,14	2,20	1,54	0,65				3,00	4250	1,1	0,2	0,0	210	250	30,2
31/05/25	4,35	1,80	1,47	0,67				3,00	4293	1,4	0,2	0,0	210	250	30,4

					R3	R7	R28								
MÉDIA	4,31	1,91	1,49	0,66	23,8	34,7	49,8	3,0	4.249	1,2	0,2	0,0	205	249	30,1
DESVIO	0,29	0,16	0,08	0,03	0,6	0,6	0,3	0,0	79	0,2	0,0	0,0	8	6	0,2
NBR 16697:2017	≤6,5	≤5,0	≤4,5		≥ 12,0	≥ 23,0	≥ 40,0				≤ 8,0	≤ 5,0	≥ 60	≤ 720	

